

Inspección VOBC CHECK S1 - Reporte de inspeccion

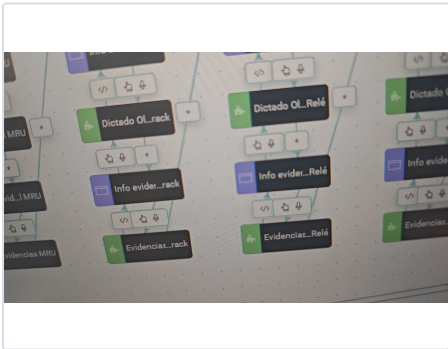
Inspección VOBC CHECK S1

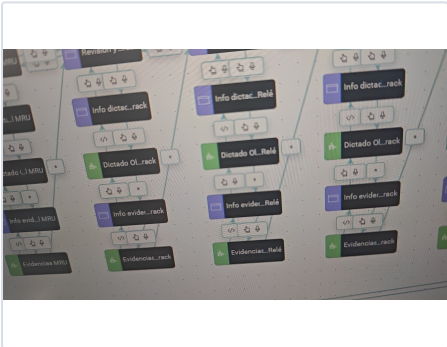
FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	03-06-2026, 02:22 p. m.	00:35	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
320	Sin datos	03-06-2026, 02:21 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-06-2026, 02:21 p. m.	03-06-2026, 02:22 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	13:54	Guardar
		
ID 39828 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:16	Valor: 4646
3. Inspección VOBC CHECK S1: Info de Línea	00:01	Línea 6
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	14:09	Valor: 6464
5. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de MRU	10:48	OK
6. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack	05:01	OK

7. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Rack Relé	02:52	OK
8. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión de Ventiladores TOP VOBC - Sub rack	03:17	OK
9. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión de Cableado	03:20	OK
10. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Acelerómetros	02:58	OK
11. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Interrogador de Transpondedor - TIU	03:49	OK
12. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Sensor de Proximidad	02:57	OK
13. Inspección VOBC CHECK S1: Revisión y limpieza de Sensores de Velocidad	07:01	OK
14. Fotografía de Fecha de Calibración del Instrumento: Evidencia	20:39	Guardar
		
ID 39903 - documentation-asset		
15. Inspección VOBC CHECK S1: Estado de Calibración de Instrumento de Medición	13:09	OK
16. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Network Switch - NS 1	13:35	OK
17. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Network Switch - NS 2	05:27	OK
18. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping OBRU - 1 Lado Derecho	06:43	OK
19. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping OBRU - 2 Lado Izquierdo	07:17	OK

20. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Acelerómetros S1	07:25	OK
21. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Acelerómetros S2	07:54	OK
22. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping TIU	08:17	OK
23. Inspección VOBC CHECK S1: Pruebas de Ping Proximity Sensor	09:27	OK
24. Inspección VOBC CHECK S1: Cierre	38:40	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
39828	documentation-asset	243.1 KiB	ca6b562723e1a9639c2608984c74c225d7611983c68d4808c3d971ba09d00391
39903	documentation-asset	356.7 KiB	398c945a0c9c9fe1d454173b08c8c42b84775be76c2faf7eeb2ed56293d1db5a
